

PROSJEKTSTATUS NMBU STYREMØTE

Dato: 08.09.2016



WEB-KAMERA ONSDAG 07.09.2016



FREMDRIFT I PROSJEKTET

- Betongarbeid er hovedaktivitet på byggeplass – noen forsinkelser, forseringstiltak iverksatt
- AF (Østfold) kontrahert til K230 «Tett hus-entreprisen».
- Fasadestein leveranse bestilt
- Første tilbudsforespørsel brukerutstyr er sendt ut og tilbudene har kommet inn. (autoklaver, store vaskemaskiner, og MR).
- Leverandør på arbeidet med gjødsel-sug fra hesteklinikken valgt.
- Tilbud på luthydrolyse enheter under evaluering
- Utomhusanleggene sendes ut på anbud i oktober med byggestart våren 2017
- Innredningsentreprisene lyses på anbud ut januar.
- Teknisk ferdigstilling høsten 2018.
- Prøvedrift av anlegget fra august 2019.


FELLESBYGGET



Vi har fått tillatelse av Riksantikvaren til å plassere Fellesbygget delvis inn i vernesonen på Fougnerhaugen. Plasseringen er også omforent med NMBU/parkråd.

Byggestart høsten 2017.

Verkstedsbygget skal rives og NMBU skal være ute av dette 1. juni 17.

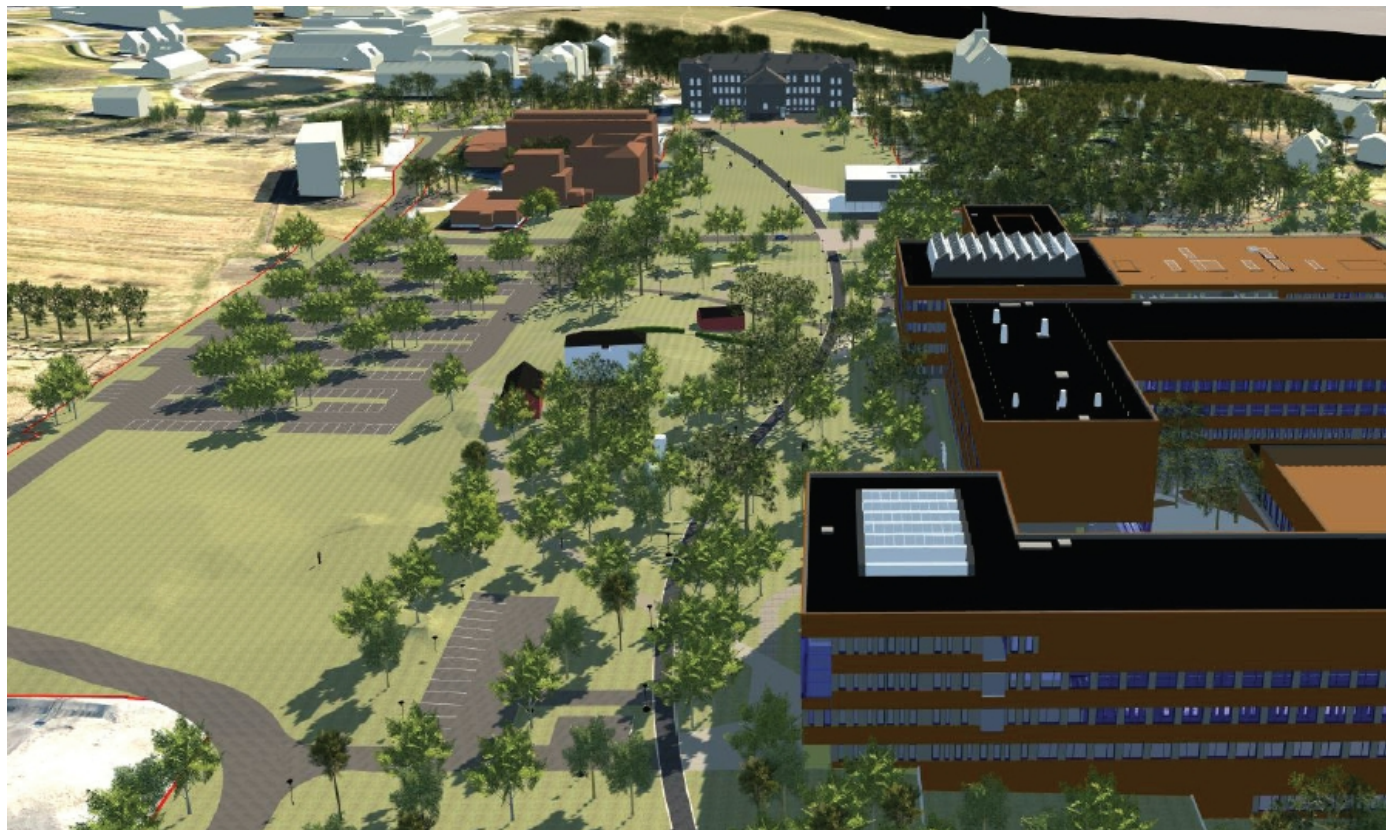



STATUS FOR PROSJEKTET

- De store prosessene med brukermedvirkning er avsluttet for hovedbyggets del.
- For brukerutstyr og Fellesbygg er det mye kontakt med brukerne.
- Kontakten nå har vi (i hovedsak) med
 - Brukerkoordinatorene – Trond Furuberg, Hans Jørgen Larsen, Åse Risberg, Berit Djønne, Ralf Kristensen.
Hovedfokus vil være på endringshåndtering.
 - Drift – Kjetil Oftebro, Arne Schie m. fl.
Hovedfokus fremover blir på opplæring, ferdigstilling, brukernes overtakelse.

BRUKERUTSTYR

- Anskaffelse av brukerutstyr er inndelt i kontraktgrupper (K9XX.XX) og gjennomføres av tverrfaglige anskaffelsesteam (= TAT-grupper).
- Anskaffelsene er tidsmessig fordelt i pulje A, B og C.
- Hver TAT-gruppe består av representanter fra Vet Inst og/eller NMBU og Statsbygg og ledes av dedikert utstyrsrådgiver (RG)
- Innkjøpsspulje A: startet opp vinter 2016
 - K901.01 MR 3.0T: tilbud mottatt fra tre leverandører, evaluering pågår
 - K941: Destruksjonsautoklaver og vaskemaskiner til bur/flasker: Fem tilbud mottatt, evaluering pågår.
- Hovedinntrykk: Markedet er svært interessert i prosjektet og tilbudte priser ser ut til å være i nærheten av våre forventninger

BRUKERUTSTYR

- Innkjøpspulje B: anskaffelsene pågår eller er svært nær oppstart
 - K901.02 CT/SPECT
 - K901.03 MR Stående hest
 - K901.04 Digital radiografi og gjennomlysning
 - K911.01 Uttakssentraler og operasjons- og undersøkelseslamper
 - K911.10 Utstyr for odontologi
 - K923.11 Avtrekkskap og sikkerhetskabinett
 - K923.12 Avsugshetter
 - K924.01 Bord og benker til obduksjon og disseksjon
 - K929.11 Utstyr til oppstalling av zebra fisk og liknende
 - K942 Vaske og steriliseringsutstyr
- Innkjøpspulje C omfatter resten av brukerstyret og de første gruppene starter opp våren 2017

ROS-ANALYSER

- Sammen med brukerne har vi gjennomført (eller skal gjennomføre) temavise ROS-gjennomganger for bruk og drift av bygget.
- I alt 18 områder er underlagt ROS-analyser. Er gjennomført sammen med brukerne. Det skrives rapport fra ROS-analysene og disse sendes brukerne ved BK.
 - Se vedlegg neste side.
 - En ROS-analyse skal analysere løsninger for bygg/områder sett opp mot rutiner for arbeid og drift.
